ACTAS DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

Hoja 1 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
3	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Centro de Documentación
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

ACTA No 1 DE COMITÉ DE

SUMINISTRO ☐ **CONSULTORIA** ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

I. PARTICIPANTES

	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. Juan Carlos Cardenas - Coordinador IDU	
Ing. William Ramirez - Coordinador Saliente IDU	
Ing. Gustavo Ardila V. - Consultor Director del Proyecto	
Ing. Jorge Salamanca - Representante Legal Consorcio	
Ing. Jorge A. Padilla R. - Consultor Especialista Estructural	
Arq. Carlos Torrijos - Consultor Especialista en Urbanismo y Arquietectura	
Ing. Carlos Yepes Maya - Director Interventoria.	

II. OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFINIDOS Y SUMINISTRADOS POR EL CONSORCIO LOS HÉROES.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay Acta Anterior.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No existe Compromisos Anteriores

V. TEMAS TRATADOS

1) Presentación Ing. William Ramirez al Ing. Juan Carlos Cardenas nuevo Coordinador IDU, Presentación de la firma Consultora por el Ing. Jorge Salamanca y de la Firma Interventora por parte del Ing. Carlos G. Yepes Maya.

2) Estado Actual del Proyecto. La Interventoria manifiesta que la fecha de iniciación se estableció el 27 de junio de 2003. Así mismo expresó que se habian revisado las hojas de vida de los especialistas de la firma consultora, cumpliendo con lo exigido en términos de referencia por lo tanto se da la aprobación, en cuanto a la metodología y programación era necesario realizar unos ajustes por parte de la firma consultora de acuerdo con observaciones de la *interventoria. El Ingeniero Jorge Salamanca manifiesta que el viernes entregaría la información pertinente. Igualmente han sido aprobadas por la* interventoria los sitios de los sondeos y las características de cada uno de ellos.

3) Póliza Consultor. Se realizaron las modificaciones correspondientes teniendo en cuenta el Acta de Inicio de los Trabajos.

4) Aprobación Estudios Urbanísticos: *El Ingeniero William Ramírez, manifestó que los estudios urbanísticos no están aprobados aún por planeación distrital,* pero que entregará los estudios realizados por el Consorcio Los Héroes al Consultor.

5) *El Ingeniero Juan Carlos Cárdenas, solicita que todos los aspectos que tienen que ver con los servicios públicos se adelanten con prontitud.*

6) *Alternativa Localización Box. El Ingeniero Salamanca, solicita una respuesta por parte del IDU con respecto a la alternativa de diseñar el Box más hacia el* norte de la solución planteada. El Ingeniero William Ramirez manifiesta que para que el IDU pueda conceptuar sobre dicha alternativa, se debe presentar por parte del Consultor una propuesta integral de las alternativas que permitan su evaluación y viabilidad.

7) *La interventoria hace entrega mediante comunicación DP-IDU-181-2003 de Julio 3, al Ingeniero Juan Carlos Cárdenas de las Hojas de Vida de los* Especialistas de la Interventoría aprobados por el Ingeniero William Ramirez.

8) *Documentos Generales. La interventoria manifiesta que se le han entregado al consultor todos los documentos necesarios para la realización de sus* estudios y diseños. Al respecto el Ing. William Ramirez expresa que los unicos documentos que no han sido entregados y que no estan aprobados por *Planeción Distrital son los correspondientes a los Estudios Urbanisticos. Estos se entregaran al Consultor por parte del Ing. William Ramirez el martes 8* de Abril de 2003. El consultor manifiesta que tiene todos los documentos necesarios para realizar los trabajos, a excepción del documento mencionado anteriormente.

Hoja 2 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
3	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

1) El Consultor se compromete a entregar la programación ajustada de acuerdo con las observaciones de la Interventoría, el Viernes 4 de julio de 2.003. — Ing. Jorge Salamanca. Representante Legal Consorcio.

2) El Ingeniero William Ramirez, por parte del IDU, se compromete a entregar a más tardar el martes 8 de julio los estudios Urbanísticos realizados por el Consorcio Los Héroes. — *Ing. William Ramirez*

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 10 (DIA) julio (MES) 2003 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de INTERVENTORÍA e instructivo

Tres (Día en letras) 3 (Día en números) días del mes de julio de 2003 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS G. YEPES MAYA
Director de Interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

Hoja 1 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
10	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

ACTA No 2 DE COMITÉ DE

SUMINISTRO ☐ **CONSULTORIA** ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

I. PARTICIPANTES

Ing. Juan Carlos Cardenas - Coordinador IDU

Ing. Jorge Salamanca - Representante Legal Consorcio

Arq. Carlos Torrijos - Consultor Especialista en Urbanismo y Arquietectura

Arq Luis Carlos Jimenez - Arq. Interventor'ia

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFINIDOS Y SUMINISTRADOS POR EL CONSORCIO LOS HÉROES.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay Observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se cumplieron los compromisos adquiridos

V. TEMAS TRATADOS

1) Sobre el Plano que contenía el planteamiento vial, y suministrado por IDU el Ingeniero J.C. Cárdenas, se encarga de consultar con el delegado de Transmilenio sobre su aceptación de ancho de calzada de 3.8 Mts en el tramo sobre el paso deprimido.
2) Tanto Consultores como el representante del IDU estuvieron de acuerdo que dado el volumen de vehiculos que bajan por la calle 76 para tomar la avenida de la autopista, el cruce peatonal propuesto por el Contrato 314 deberia modificarse: Cruzando la 76 en sentido norte-sur y luego cruzando la Caracas en *sentido Oriente - Occidente en una sola fase.*
3) Representante del IDU realizó una revisión de actividades Chec list sobre los compromisos de los contratistas que contenian los siguientes puntos: Topográficos, Estudios y Diseños del espacio Público, Redes de Servicios Públicos , Estudios de Suelos y Geotécnicos, Estudio y Diseño Estructurales, Estudio de Diseño de Fundaciones.
4) Se acordó realizar una reunión en el taller del Espacio Público el dia Lunes 14 de Julio a las 9.0 am en el DAPD.
5) El Consultor *solicito tener una reunión con la secretaría de transito para conocer referencias a la aprobación de diseños señalización y semáforos.*
6)
7)
8)

Hoja 2 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
10	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS — RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 17 (DIA) julio (MES) 2003 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de INTERVENTORÍA e instructivo.

Diez (Día en letras) 10 (Día en números) días del mes de Julio de 2003 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS G. YEPES MAYA
Director de Interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

Hoja 1 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
17	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

ACTA No 3 DE COMITÉ DE

SUMINISTRO ☐ **CONSULTORIA** ☑ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN** ☐

I. PARTICIPANTES

Ing. Juan Carlos Cardenas - Coordinador IDU

Ing. Jorge Salamanca - Coordinador Consultor

Arq. Carlos Torrijos - Especialista Urbanismo - Consultor

Arq Luis Carlos Jimenez - Especialista Urbanismo - Interventoría

Ing. Carlos Yepes Maya - Director Interventoría

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFINIDOS Y SUMINISTRADOS POR EL CONSORCIO LOS HÉROES.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay Observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se cumplieron los compromisos adquiridos

V. TEMAS TRATADOS

1) El Ing. Juan Carlos Cardenas entregó al Consultor y a la interventoría copia del memorando No STCI-9100-35677 de la Subdirección Técnica General del IDU a la Dirección Técnica de Construcción del IDU, donde se establecen aspectos que se deben considerar en los diseños de obras de drenaje en zonas de espacio público, para no tener inconvenientes en el recibo de estos por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP.

2) El Ing. Jorge Salamanca realizó una presentación general del informe de avance No 1, en los aspectos Topográficos, Hidráulicos, Eléctricos, Estructurales y de Geotécnia.

3) El Arq. Carlos Torrijos, presentó el proyecto de espacio público. En el concepto del Arq. Luis Carlos Jimenez, Especialista en Urbanismo por parte de la interventoría se sugirió, presentar fachadas laterales del proyecto, mayores detalles en lo que tiene que ver con las barandas, mejorar el aspecto del concreto, acotar con mayor enfásis los planos.

4) El Ing. Jorge Salamanca entrego a la interventoría el informe de avance No 1 que comprende: Informe General de cada una de las actividades:

- Estudio Topográfico y Planteamiento Vial - Ing. Enrique Hernández
- Espacio Público y Paisajismo - Arq. Carlos Torrijos
- Diseño Hidráulico - Ing. Jaime Mora
- Proyecto Estructural - Ing. Jorge Padilla
- Diseño Eléctrico - Ing. Alvaro Mogollón
- Diseño Geotécnico - Ing. Carlos Restrepo.

5) Anexos:

- Planta con cotas de pavimento cada 10 m. para las tres calzadas - una figura
- Sección de Diseño Transversal cada 10 m - Dos figuras
- Diseño Urbanistico (Planta, Cortes, Detalles) - Un Plano
- Cálculo de Colectores Combinados - Memorias de Calculo (2 Hojas)
- Cantidades de tuberia de alcantarillado - Una Hoja
- Planta General de Alcantarillado - Un Plano
- Tipología y predimensionamiento de muros laterales y corte tipo de cubierta y cimentación del Box - Una figura
- Planta y Corte de Muros Laterales - Una Figura
- Anteproyecto Diseño Eléctrico (Planta)
- Oficio EPM No DE-MONT-03-63 Una Hoja
- Informe Estudio Getécnico

Hoja 2 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
17	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS

RESPONSABLES

Revisar por parte de cada uno de los especialistas de la interventoría la información entregada por el consultor, para entregar a los consultores el lunes 21 (De ser posible reuniones entre especialistas)	Especialistas Interventoría

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 24 (DÍA) julio (MES) 2003 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de INTERVENTORÍA e instructivo

Diez y siete (Día en letras) 17 (Día en números) días del mes de Julio de 2003 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS G. YEPES MAYA
Director de Interventoría

Original
1ra copia
2da copia

Hoja 1 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
24	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

ACTA No 4 DE COMITÉ DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☑ OBRA ☐ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐

I. PARTICIPANTES

	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. Juan Carlos Cardenas - Coordinador *IDU*	
Ing. Gustavo Ardila V. - Consultor Director del Proyecto	
Arq. Carlos Torrijos Consultor Especialista Urbanismo	
Ing. Jorge Salamanca - Representante Legal Consorcio	
Ing. Carlos Yepes Maya - Director Interventoría	

II. OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFINIDOS Y SUMINISTRADOS POR EL CONSORCIO LOS HÉROES.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No hay Observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se cumplieron los compromisos adquiridos

V. TEMAS TRATADOS

1) El Ing. Juan Carlos Cárdenas hace entrega al Consultor y a la Interventoría el nuevo formato del Flujo de Caja para su diligenciamiento.
2) El Arq. Carlos Torrijos realizó la Presentación del Proyecto de Espacio Público con los ajustes señalados por el Arq. Luis Carlos Jimenez Especialista de la Interventoría. En el día de Mañana Julio 25/2003, será presentado el proyecto al Taller de Espacio Público.
3) Se efectuó una análisis del estado de cada uno de las áreas de los proyectos (Hidráulica, Geotécnica, Eléctrica, Estructural, Espacio Público) y se establecio la entrega de estos estudios para el sabado 26 de julio de 2003.
4) Se planteo la conveniencia de presentar los estudios hidráulicos al Ing. Caldas en el IDU.

Hoja 2 de 2			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
24	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISOS PACTADOS — RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de INTERVENTORÍA e instructivo

Veinticuatro (Día en letras) 24 (Día en números) días del mes de Julio de 2003 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) CARLOS G. YEPES MAYA
Director de Interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista

INFORME SEMANAL DE LA CONSULTORÍA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
3	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. C-397

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEMANA No. 1 **DEL** 27 de Junio de 2003 **AL** 3 de Julio de 2003

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 8

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL IDU Ing. Juan Carlos Cardenas

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 70, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFINIDOS Y SUMINISTRADOS POR EL CONSORCIO LOS HÉROES.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	15	15	Obra Ejecutada	15	15
Valor de la Obra Programada	4,421,316.40	4,421,316.40	Valor de la Obra Ejecutada	4,421,316.40	4,421,316.40

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	Consorcio Jorge Padilla - Jorge Salamanca	Interventor	G.P.I. Ltda
Contrato No.	DTA C 399	Contrato No.	C 397
Valor Inicial	29,475,436.00	Valor Inicial	12,429,179.00
Valor Actualizado	29,475,436.00	Valor Actualizado	12,429,179.00
Plazo Inicial	Un (1) Mes	Plazo Inicial	Un (1) Mes
Plazo Actualizado	Un (1) Mes	Plazo Actualizado	Un (1) Mes
Fecha de Iniciación	27-Jun-03	Fecha de Iniciación	27-Jun-03
Fecha de Terminación	27-Jun-03	Fecha de Terminación	27-Jun-03
No.de empleos generados		No. De empleos generados	

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Revisión del cumplimiento de los requisitos por parte de los especialistas del consultor, Revisión de la metodología y cronograma de actividades, Documentación, Aprobación de los lugares de los sondeos y características de cada uno de ellos, Comité de inicio del contrato, Aprobación por parte de la interventoría de los especialistas del consultor, de la metodología y arranque de actividades.

Topografía, Exploración del subsuelo y caracterización Geotécnica, ensayos de campo.

C. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Determinación Parámetros de Diseño

Presentación del diseño urbanístico del espacio público

D. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se desarrollo de acuerdo al cronograma de actividades programado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los Tres (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2003 (Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

Ninguna

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS G YEPES MAYA
Nombre

Firma

Original: Dependencia Responsable del Contrato
1 ero copia: Interventor

CONTRATO DTA-C-399

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76 EN BOGOTA, D.C.

Cronograma de Actividades - Fecha de inicio 27Jun/03

ACTIVIDAD	SEMANAS					AREA
	Precontractual	1	2	3	4	
0,1) Revisión de topografía existente						Topografía, Hidráulica y Eléctrica
Revision de archivos magneticos						
Replanteo en campo						
Cierre de la poligonal y verificación de Ejes de construcción						
0,2) Exploración del subsuelo y caracterización geotécnica						Geotecnia
Planificación, Permisos, logistica						
Exploración del subsuelo y ensayos de campo						
Caracterización Geotecnica (Ensayos de laboratorio y análisis de resultados)						
Determinación de Parámetros de diseño geotécnico						
1) Presentación del Planteamiento vial						Interventoria, Entidad
Comité de Inicio del contrato						
Entrega de suministros por parte del IDU (Planos y Estudios)						
2) Revisión y validación del Planteamiento vial y de los insumos						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica,
Entrega por parte del IDU de las aprobaciones existentes (Acta)						
3) Ajustes al Planteamiento vial						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Concepto de los Especialistas sobre los insumos suministrados						
Observaciones de la Interventoria a los prediseños presentados						
4) Aprobación del Prediseño del paso deprimido						Interventoria, Entidad
Presentación del proyecto Arquitectonico al Taller de Espacio público						
Aprobación de prediseños por parte del Interventoria - TRANSMILENIO						
Entrega del Primer Informe de Avance (Todas alas Areas)						
5) Elaboración de diseños detallados, cantidades de obra y presupuesto						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Presentación del proyecto ante las diferentes entidades de servicios públicos						
Elaboración de planos de construcción detallados						
Atención de observaciones de las diferentes entidades (EAAB, CODENSA, ETB, ETC)						
Aprobación del proyecto por parte de las diferentes entidades						
Entrega de Segundo informe de Avance (Todas alas Areas)						
6) Definición de especificaciones y normas. Manual ténico del paso deprimido.						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Definición de Especificaciones y Normas						
Manual Técnico del paso deprimido						
7) Elaboración de pliegos de construcción						Coordiación
Entrega de Insumos por parte del del IDU (Pliegos Generales, Precios unitarios actualizados, etc)						
Entrega de Borrador de Pliegos a la Interventoria						
Atención a las observaciones de la interventoria						
8) Entrega de Estudios y diseños, Presupuesto de obra y Pliego de construcción						Coordinación, Interventoria, Entidad
Entrega de Informe Final						
Aprobación por parte de la Interventoria						

Julio 3

012

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
10	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEMANA No. 2 **DEL** 4 de Julio de 2003 **AL** 10 de Julio de 2003

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 16

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL IDU Ing. Juan Carlos Cardenas

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFIN

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	25	40	Obra Ejecutada	25	40
Valor de la Obra Programada	7,368,859.00	11,790,174.40	Valor de la Obra Ejecutada	7,368,859.00	11,790,174.40

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	Consorcio Jorge Padilla - Jorge Salamanca	Interventor	G.P.I. Ltda
Contrato No.	DTA C 399	Contrato No.	C 397
Valor Inicial	29,475,436.00	Valor Inicial	12,429,179.00
Valor Actualizado	29,475,436.00	Valor Actualizado	12,429,179.00
Plazo Inicial	Un (1) Mes	Plazo Inicial	Un (1) Mes
Plazo Actualizado	Un (1) Mes	Plazo Actualizado	Un (1) Mes
Fecha de Iniciación	27-Jun-03	Fecha de Iniciación	27-Jun-03
Fecha de Terminación	27-Jun-03	Fecha de Terminación	27-Jun-03
No.de empleos generados		No. De empleos generados	

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se determinaron los parámetros de diseño

Se presento en una reunión informal el diseño urbanistico al taller del espacio público en planeación distrital, con el propósito de conocer si existia por parte de esta entidad alguna recomendación especial.

Se trabajo en los diseños hidráulicos, eléctricos, geotécnicos y de estructuras.

C. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega del primer informe de avance en todas las áreas

Presentación de los proyectos a las diferentes entidades de servicios públicos

Trabajos en especificaciones, manual técnico, normas pliegos

D. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades se desarrollan de acuerdo al cronograma de actividaes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo

Diez (Día en letras) (10) (Día en números) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2003 (Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

Ninguna

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS G YEPES MAYA
Nombre

Firma

Original Dependencia Responsable del Contrato
1ero copia Interventor

Dirección de consulta: Intranet/Publicaciones Gestor IDU/Formatos/Interventoria

STDO-00179

CONTRATO DTA-C-399

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76 EN BOGOTA, D.C.

Cronograma de Actividades - Fecha de inicio 27Jun/03

ACTIVIDAD	SEMANAS: Precontractual	1	2	3	4	AREA
0,1) Revisión de topografía existente						Topografía, Hidráulica y Eléctrica
Revision de archivos magneticos						
Replanteo en campo						
Cierre de la poligonal y verificación de Ejes de construcción						
0,2) Exploración del subsuelo y caracterización geotécnica						Geotecnia
Planificación, Permisos, logística						
Exploración del subsuelo y ensayos de campo						
Caracterización Geotecnica (Ensayos de laboratorio y análisis de resultados)						
Determinación de Parámetros de diseño geotécnico						
1) Presentación del Planteamiento vial						Interventoria, Entidad
Comité de Inicio del contrato						
Entrega de suministros por parte del IDU (Planos y Estudios)						
2) Revisión y validación del Planteamiento vial y de los insumos						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica,
Entrega por parte del IDU de las aprobaciones existentes (Acta)						
3) Ajustes al Planteamiento vial						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Concepto de los Especialistas sobre los insumos suministrados						
Observaciones de la Interventoria a los prediseños presentados						
4) Aprobación del Prediseño del paso deprimido						Interventoria, Entidad
Presentación del proyecto Arquitectonico al Taller de Espacio público						
Aprobación de prediseños por parte del Interventoría - TRANSMILENIO						
Entrega del Primer Informe de Avance (Todas alas Areas)						
5) Elaboración de diseños detallados, cantidades de obra y presupuesto						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Presentación del proyecto ante las diferentes entidades de servicios públicos						
Elaboración de planos de construcción detallados						
Atención de observaciones de las diferentes entidades (EAAB, CODENSA, ETB, ETC)						
Aprobación del proyecto por parte de las diferentes entidades						
Entrega de Segundo informe de Avance (Todas alas Areas)						
6) Definición de especificaciones y normas. Manual ténico del paso deprimido.						Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Definición de Especificaciones y Normas						
Manual Técnico del paso deprimido						
7) Elaboración de pliegos de construcción						Coordiación
Entrega de Insumos por parte del del IDU (Pliegos Generales, Precios unitarios actualizados, etc)						
Entrega de Borrador de Pliegos a la Interventoria						
Atención a las observaciones de la interventoria						
8) Entrega de Estudios y diseños. Presupuesto de obra y Pliego de construcción.						Coordinación, Interventoria, Entidad
Entrega de Informe Final						
Aprobación por parte de la Ionterventoria						

JULIO 10

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
17	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEMANA No. 3 **DEL** 11 de Julio de 2003 **AL** 17 de Julio de 2003

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 24

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL IDU Ing. Juan Carlos Cardenas

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFIN

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	30	70	Obra Ejecutada	30	70
Valor de la Obra Programada	8,842,630.80	20,632,805.20	Valor de la Obra Ejecutada	8,842,630.80	20,632,805.20

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	Consorcio Jorge Padilla - Jorge Salamanca	Interventor	G.P.I. Ltda
Contrato No.	DTA C 399	Contrato No.	C 397
Valor Inicial	29,475,436.00	Valor Inicial	12,429,179.00
Valor Actualizado	29,475,436.00	Valor Actualizado	12,429,179.00
Plazo Inicial	Un (1) Mes	Plazo Inicial	Un (1) Mes
Plazo Actualizado	Un (1) Mes	Plazo Actualizado	Un (1) Mes
Fecha de Iniciación	27-Jun-03	Fecha de Iniciación	27-Jun-03
Fecha de Terminación	27-Jun-03	Fecha de Terminación	27-Jun-03
No.de empleos generados		No. De empleos generados	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se entrega el 17 de julio el primer informe de avance por parte del consultor a la interventoría, correspondiente a los Estudios Geotécnicos, Eléctricos, Hidráulicos, Estructural, y de Espacio Público.

Se han presentado parcialmente los proyectos a las entidades de Servicios Públicos (Eléctricos).

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega definitiva de los estudios.

Aprobación por parte de las diferentes entidades de servicios públicos.

Aprobación por parte del Taller de Espacio Público.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las actividades se desarrollan de acuerdo al cronograma de actividades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo

Diez y siete (Día en letras) (17) (Día en números) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2003 (Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

Ninguna

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS G YEPES MAYA
Nombre

Firma

Original: Dependencia Responsable del Contrato
1ero copia: Interventor

CONTRATO DTA-C-399

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76 EN BOGOTA, D.C.

Cronograma de Actividades - Fecha de inicio 27Jun/03

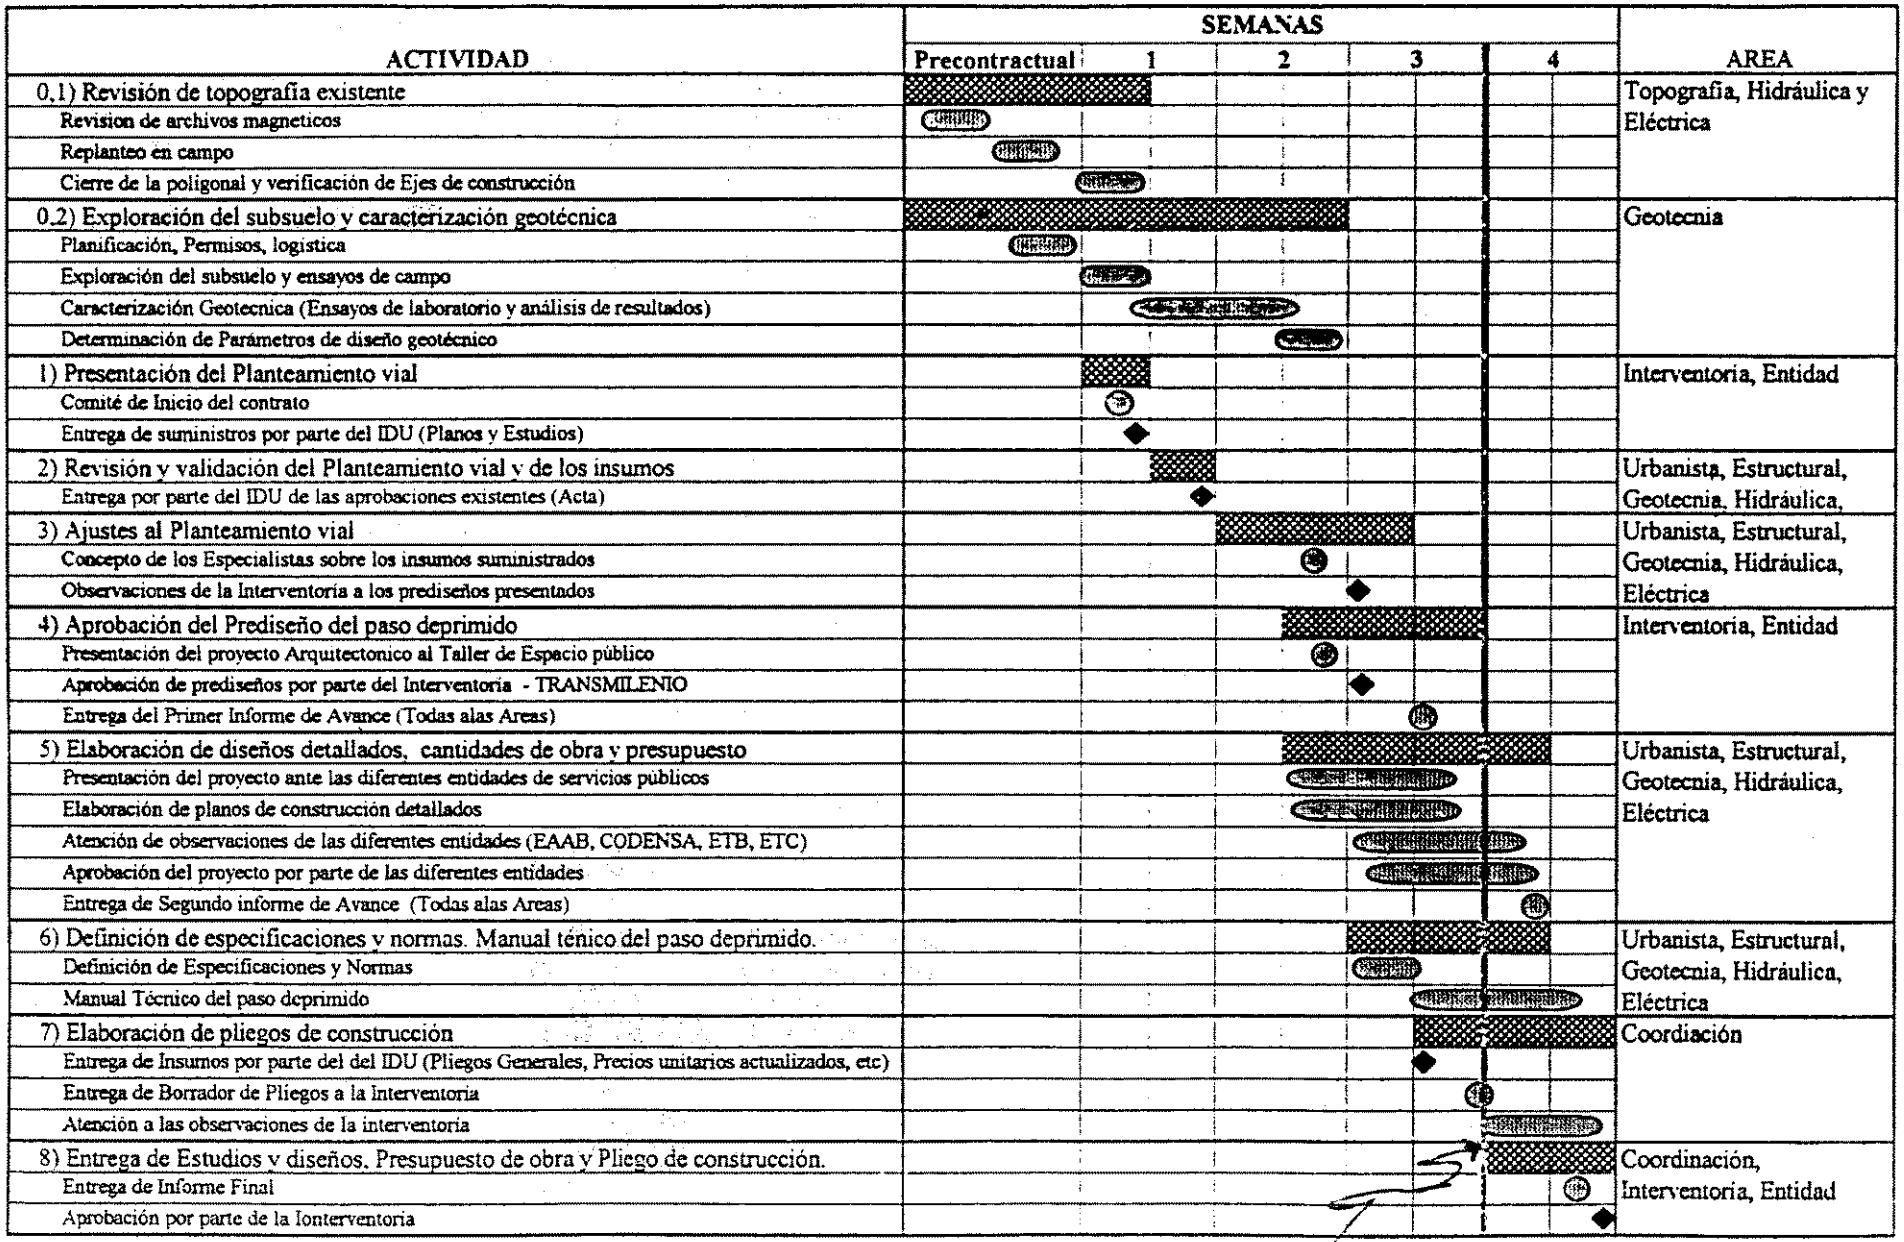
ACTIVIDAD
SEMANAS
Precontractual
1
2
3
4
AREA
0,1) Revisión de topografía existente
Topografía, Hidráulica y Eléctrica
Revision de archivos magneticos
Replanteo en campo
Cierre de la poligonal y verificación de Ejes de construcción
0,2) Exploración del subsuelo y caracterización geotécnica
Geotecnia
Planificación, Permisos, logistica
Exploración del subsuelo y ensayos de campo
Caracterización Geotecnica (Ensayos de laboratorio y análisis de resultados)
Determinación de Parámetros de diseño geotécnico
1) Presentación del Planteamiento vial
Interventoria, Entidad
Comité de Inicio del contrato
Entrega de suministros por parte del IDU (Planos y Estudios)
2) Revisión y validación del Planteamiento vial y de los insumos
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica,
Entrega por parte del IDU de las aprobaciones existentes (Acta)
3) Ajustes al Planteamiento vial
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Concepto de los Especialistas sobre los insumos suministrados
Observaciones de la Interventoria a los prediseños presentados
4) Aprobación del Prediseño del paso deprimido
Interventoria, Entidad
Presentación del proyecto Arquitectonico al Taller de Espacio público
Aprobación de prediseños por parte del Interventoria - TRANSMILENIO
Entrega del Primer Informe de Avance (Todas alas Areas)
5) Elaboración de diseños detallados, cantidades de obra y presupuesto
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Presentación del proyecto ante las diferentes entidades de servicios públicos
Elaboración de planos de construcción detallados
Atención de observaciones de las diferentes entidades (EAAB, CODENSA, ETB, ETC)
Aprobación del proyecto por parte de las diferentes entidades
Entrega de Segundo informe de Avance (Todas alas Areas)
6) Definición de especificaciones y normas. Manual ténico del paso deprimido.
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Definición de Especificaciones y Normas
Manual Técnico del paso deprimido
7) Elaboración de pliegos de construcción
Coordiación
Entrega de Insumos por parte del del IDU (Pliegos Generales, Precios unitarios actualizados, etc)
Entrega de Borrador de Pliegos a la Interventoria
Atención a las observaciones de la interventoria
8) Entrega de Estudios y diseños. Presupuesto de obra y Pliego de construcción.
Coordinación, Interventoria, Entidad
Entrega de Informe Final
Aprobación por parte de la Ionterventoria

Julio 17

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL	TÉCNICA
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
26	Julio	03		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. C-397

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEMANA No. 4 **DEL** 17 de Julio de 2003 **AL** 26 de Julio de 2002

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 30

NOMBRE DEL COORDINADOR DEL IDU Ing. Juan Carlos Cardenas

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMÁS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76, EN BOGOTÁ D.C. EN EL ANCHO ESTABLECIDO POR LOS PARÁMETROS DEFIN

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	30	100	Obra Ejecutada	30	100
Valor de la Obra Programada	8,842,630.80	29,475,436.00	Valor de la Obra Ejecutada	8,842,630.80	29,475,436.00

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	Consorcio Jorge Padilla - Jorge Salamanca	Interventor	G.P.I. Ltda
Contrato No.	DTA C 399	Contrato No.	C 397
Valor Inicial	29,475,436.00	Valor Inicial	12,429,179.00
Valor Actualizado	29,475,436.00	Valor Actualizado	12,429,179.00
Plazo Inicial	Un (1) Mes	Plazo Inicial	Un (1) Mes
Plazo Actualizado	Un (1) Mes	Plazo Actualizado	Un (1) Mes
Fecha de Iniciación	27-Jun-03	Fecha de Iniciación	27-Jun-03
Fecha de Terminación	27-Jun-03	Fecha de Terminación	27-Jun-03
No.de empleos generados		No. De empleos generados	

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Preparación de documentación para entrega a interventoría.Adelantar Labores en los Pliegos de Condiciones, especificaciones Ténicas y Presupuestos.
Entrega el 26 de Julio de 2003 de los siguientes documentos para revisión de la Interventoría:
Diseño Geométrico, Diseño Urbanistico y Paisajistico, Diseño de Redes Eléctricas, Diseño de Redes Hidráulicas, Diseño de Estructuras de Concreto.

C. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajustes según revisiones y concepto de la Interventoría.
Obtención por parte del Consultor de las aprobaciones, tanto de Espacio Publico por parte del Planeación Distrital, como de las Entidades de servicio Publico que se requieran.

D. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se termino de acuerdo con el cronograma de actividades establecido y entra en su etapa de revisión por parte de los Especialistas de la Interventoría, para su aprobación final.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo

Veintiseis (Día en letras) (26) (Día en números) días del mes de Julio (Mes en que se firma el acta) de 2003 (Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

El Pliego de Condiciones de Construcción se entrego de manera parcial.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS G YEPES MAYA
Nombre

Firma

Original: Dependencia Responsable del Contrato
1 ora copia: Interventor

CONTRATO DTA-C-399

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO DEPRIMIDO VEHICULAR Y DEMAS ESTRUCTURAS REQUERIDAS SOBRE LA AVENIDA CARACAS A LA ALTURA DE LA CALLE 76 EN BOGOTA, D.C.

Cronograma de Actividades - Fecha de inicio 27Jun/03

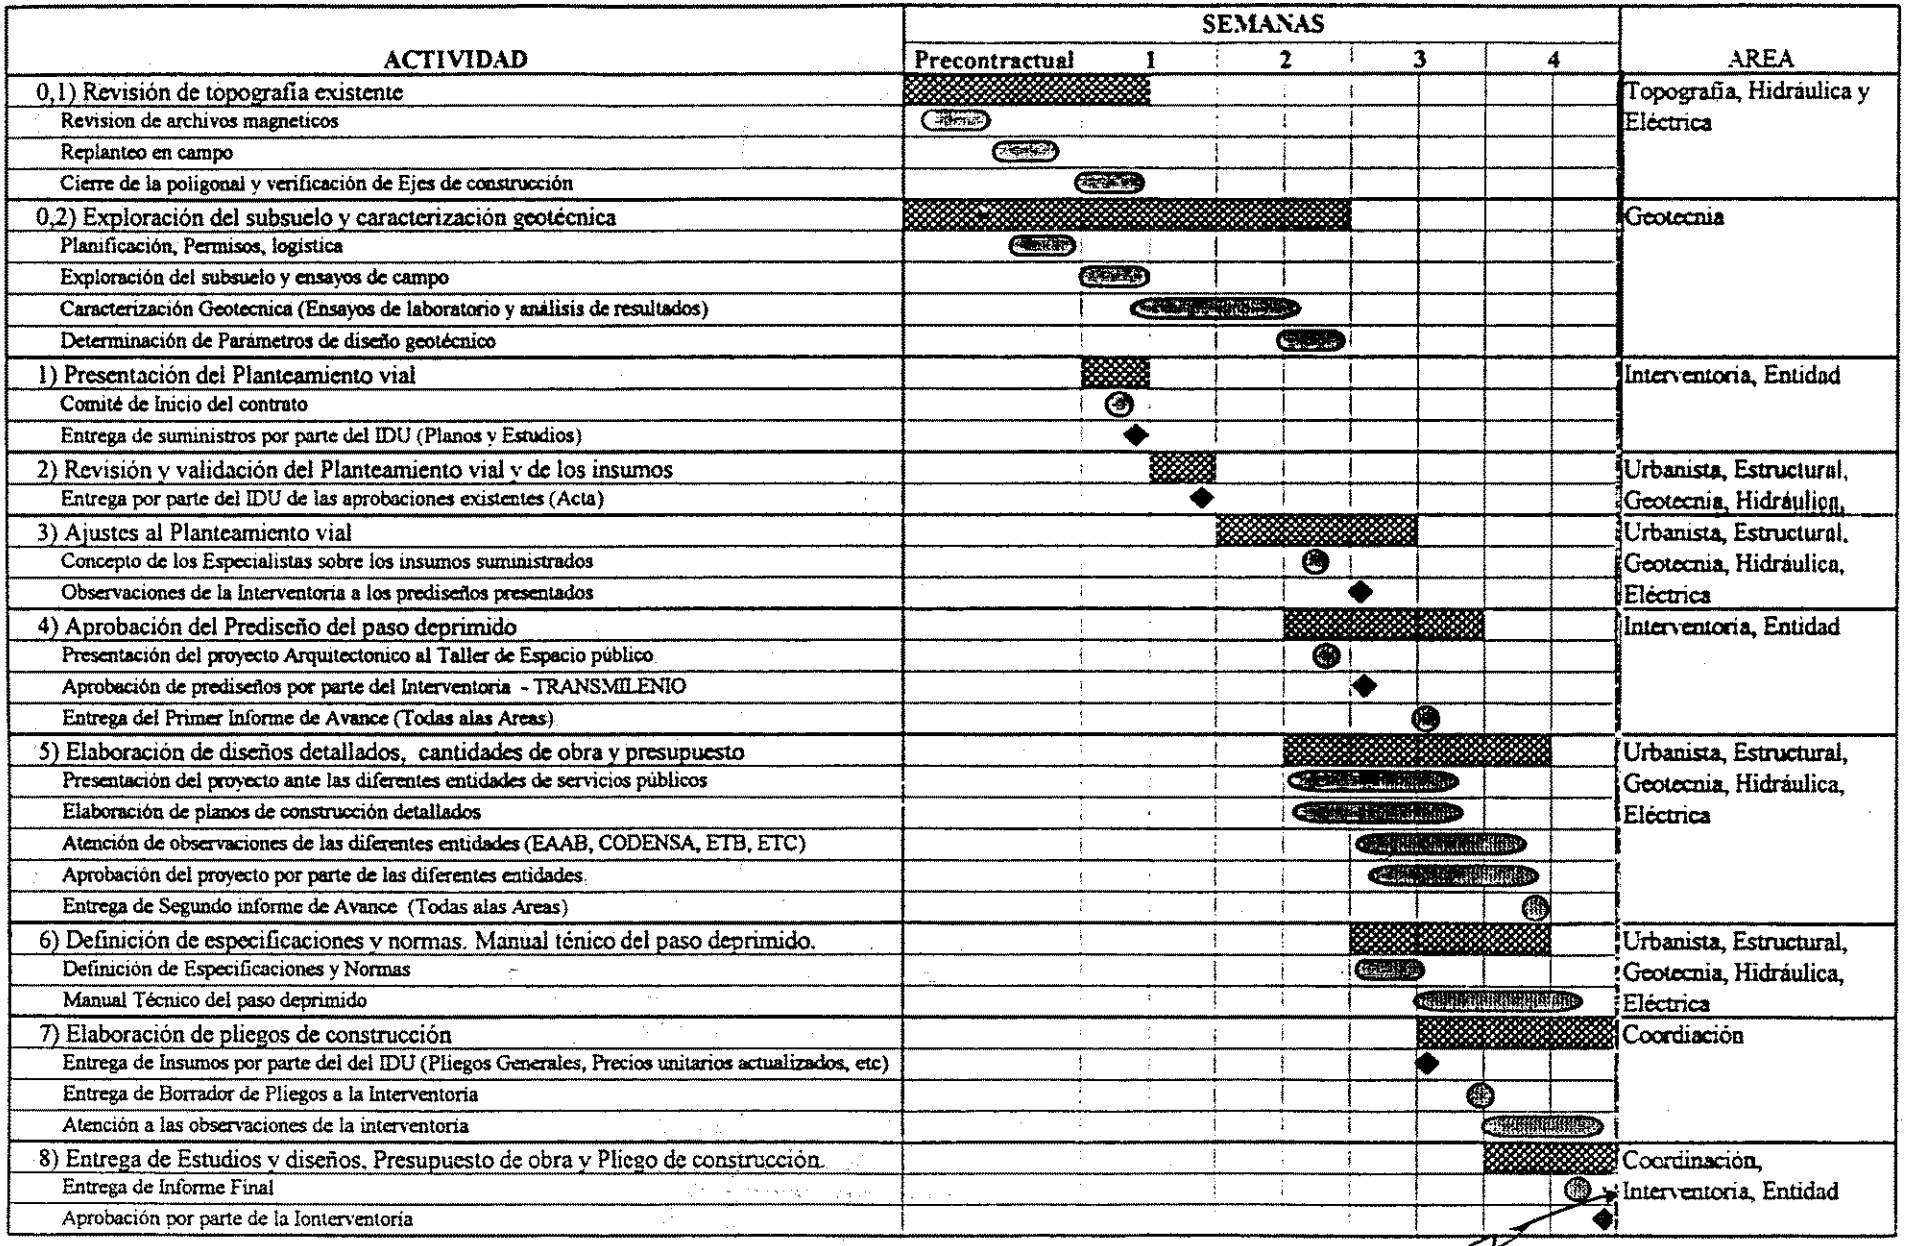
ACTIVIDAD
SEMANAS
Precontractual
1
2
3
4
AREA
0,1) Revisión de topografía existente
Topografía, Hidráulica y Eléctrica
Revision de archivos magneticos
Replanteo en campo
Cierre de la poligonal y verificación de Ejes de construcción
0,2) Exploración del subsuelo y caracterización geotécnica
Geotecnia
Planificación, Permisos, logistica
Exploración del subsuelo y ensayos de campo
Caracterización Geotecnica (Ensayos de laboratorio y análisis de resultados)
Determinación de Parámetros de diseño geotécnico
1) Presentación del Planteamiento vial
Interventoria, Entidad
Comité de Inicio del contrato
Entrega de suministros por parte del IDU (Planos y Estudios)
2) Revisión y validación del Planteamiento vial y de los insumos
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica,
Entrega por parte del IDU de las aprobaciones existentes (Acta)
3) Ajustes al Planteamiento vial
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Concepto de los Especialistas sobre los insumos suministrados
Observaciones de la Interventoria a los prediseños presentados
4) Aprobación del Prediseño del paso deprimido
Interventoria, Entidad
Presentación del proyecto Arquitectonico al Taller de Espacio público
Aprobación de prediseños por parte del Interventoria - TRANSMILENIO
Entrega del Primer Informe de Avance (Todas alas Areas)
5) Elaboración de diseños detallados, cantidades de obra y presupuesto
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Presentación del proyecto ante las diferentes entidades de servicios públicos
Elaboración de planos de construcción detallados
Atención de observaciones de las diferentes entidades (EAAB, CODENSA, ETB, ETC)
Aprobación del proyecto por parte de las diferentes entidades.
Entrega de Segundo informe de Avance (Todas alas Areas)
6) Definición de especificaciones y normas. Manual ténico del paso deprimido.
Urbanista, Estructural, Geotecnia, Hidráulica, Eléctrica
Definición de Especificaciones y Normas
Manual Técnico del paso deprimido
7) Elaboración de pliegos de construcción
Coordiación
Entrega de Insumos por parte del del IDU (Pliegos Generales, Precios unitarios actualizados, etc)
Entrega de Borrador de Pliegos a la Interventoria
Atención a las observaciones de la interventoria
8) Entrega de Estudios y diseños, Presupuesto de obra y Pliego de construcción.
Coordinación, Interventoria, Entidad
Entrega de Informe Final
Aprobación por parte de la Ionterventoria

JULIO 26

0 5
INSTITUTO DE DESARROLLO U...
Centro de Documentación

CARTAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

0 4

ALCALDÍA
MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Departamento
Administrativo de
PLANEACIÓN
DISTRITAL

Planeación Distrital - Dapd
20/02/2004 04:52:36 PM
Al Responder Cite 2-2004-03104
Referencia 1-2004-00600 Folios 2
Medio Mensajería Externa Anexos 0
Destino Consorcio Jorge Salamaca
Con Copia a Idu

6000
Bogotá D.C.

Doctor
JORGE SALAMANCA R
Representante Legal
Consorcio Jorge Salamanca R– Jorge Padilla
Diagonal 87 N° 25-48 of. 204 Bogotá
Ciudad

Asunto: Contrato IDU-DTA-C-399 Estudios y diseños paso deprimido vehicular y demás estructuras requeridas sobre la avenida Caracas a la altura de la calle 76 enBogotá D.C

Ref: 1-2004-00600 / 1-2003-19867

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se solicita respuesta al radicado 1-2003-19867 de 20003, en relación con la aprobación del diseño del espacio público del contrato IDU-DTA-C-399 se informa lo siguiente:

En los oficios de respuesta a las radicaciones 1.2003-33071, 1-200328991 y 1-2003-07484, mediante los cuales se presentó la solución vial necesaria para la intersección de las avenidas Medellín por avenida Paseo Los Libertadores, se aceptó el proyecto presentado, en el cual está incluido el diseño del espacio público.

En consecuencia, el tratamiento del espacio público previsto en el contrato IDU-DTA-C-399, cuenta con la aprobación de este Departamento.

Cabe anotar que este Departamento está a la espera de los planos definitivos, impresos en papel seguridad, para elaborar el proyecto de Resolución de reserva

ALCALDÍA
MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Departamento
Administrativo de
PLANEACIÓN
DISTRITAL

vial de los predios que se requieren para la ejecución del proyecto de la referencia, de acuerdo con la respuesta al radicado 1-2003 - 33071 y lo definido en consulta directa con el consultor, en relación con el ajuste del alineamiento previsto en el costado oriental, entre calles 76 y 78.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO
Gerente De Tráfico Transporte Y Vías

ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS
Gerente Taller Del Espacio Público

Proyectó: Leyla M Alvarez Piedrahita

c.c. Diego Sánchez Fonseca
Director Técnico de Construcciones IDU
Calle 22 N° 6-27

0 2

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

IDU-048058 STCI-9100

Bogotá D.C., Marzo 10 de 2004

Señores
CONSORCIO JORGE SALAMANCA – JORGE PADILLA
Ing. Jorge Salamanca R.
Carrera 87 No 25-48 Oficina 204
Ciudad

Ref.: Contrato DTA-C-399 de 2002. Estudios y diseños del paso deprimido y demás estructuras requeridas sobre la Avenida Caracas a la altura de la Calle 76 en Bogotá D.C. Aprobación diseño alcantarillado

Respetado Ingeniero:

Por medio del presente me permito informarle que el proyecto de alcantarillado elaborado por ustedes, para el paso deprimido sobre la Avenida Caracas a la altura de la Calle 76, ha sido revisado y se encuentra **aprobado** por la Ingeniera Vivian J. Correa Mendivelso (Especialista Hidráulica IDU), de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interinstitucional No 051/99 celebrado con la EAAB-ESP.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Instituto de Desarrollo Urbano

Al proyecto le ha sido asignado el No 6455 y se encuentra conformado por los siguientes documentos:

- Un plano: en el que se incluye planta general del proyecto, áreas de drenaje y detalles
- Informe técnico: 1 Volumen
- Medio Magnético: 1 CD

Cordialmente,

MARIA CONSTANZA SEGURA ESCOBAR
Subdirectora Técnica de Coordinación Interinstitucional

Revisó : Miguel Caldas Tafur
Elaboró: Vivian Correa Mendivelso
Copia. Juan Carlos Cárdenas - Coordinador Proyecto IDU
Subdirección Técnica de Coordinación Interinstitucional - Consecutivo

RECIBIDO: CARLOS YEPES
MARZO 16 DE 2004
3P.M.

I 0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Ing Juan C. Cardenas
¿Que hace falta para liquidar? gz

MEMORANDO

STPE-1100-15001

FECHA Bogotá D.C, 9 de marzo de 2004

PARA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS
José Félix Gómez Pantoja

DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Ing. Jorge Alberto Arias Hernández

REFERENCIA: STED-3200-06490. Contrato IDU DTA-C-399

Me permito informarle que revisada la información (Un CD Room) correspondiente a los archivos en formato CAD del contrato: **IDU DTA C 399 –** Estudios y Diseños del paso deprimido vehicular y demás estructuras requeridas sobre la Av. Caracas a la altura de la calle 76 en Bogota D.C;; se ajusta a los estándares establecidos por el IDU (Aplicación: Idu_Scad_Gis).

Por lo anterior, la información será migrada al servidor de Mapas - planos récord y diseños del Instituto.

Atentamente,

JORGE ALBERTO ARIAS HERNANDEZ
Subdirector Técnico Planeación Estratégica

Revisó: Ing. Luis Hernán Pérez Silva
Elaboró. Yasmin Espinosa Valbuena

10 MAR. 2004

12 MAR. 2004
9:16
